

**Договор № \_\_\_\_\_**  
**на выполнение работ по созданию ведомственной опорной геодезической сети по автомобильной дороге М-12 «Восток» участок Москва – Казань (0 – 8 этап)**

г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор - Инжиниринг» (ООО «Автодор - Инжиниринг»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили между собой настоящий договор (далее – Договор) по результатам проведения \_\_\_\_\_ о нижеследующем:

### **1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства собственными и привлеченными силами и средствами в сроки, предусмотренные главой 2 Договора и Календарным планом (далее – Календарный план) (Приложение № 2 к Договору) выполнить работы по созданию ведомственной опорной геодезической сети по автомобильной дороге М-12 «Восток» участок Москва – Казань (0 – 8 этап) в соответствии с условиями Договора (далее – Работы), состав и объем которых определен Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), с учетом соблюдения требований нормативных и технических документов и стандартов, указанных в Приложении № 1 к Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять результат надлежаще выполненных Работ и оплатить их в соответствии с условиями Договора и приложений к нему.

1.2. Существенными условиями для Сторон являются предмет, цена, сроки выполнения Работ, а также любые другие условия, которые указаны в Договоре в качестве существенных.

1.3. Результатом Работ по Договору является ведомственная опорная геодезическая сеть по автомобильной дороге М-12 «Восток» участок Москва – Казань (0 – 8 этап).

1.4. Все взаимоотношения при исполнении Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде.

### **2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

2.1. Календарные сроки выполнения Работ устанавливаются в Календарном плане.

Начало выполнения Работ: с даты заключения Договора.

Окончание выполнения Работ: 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения Договора.

2.2. Сроки выполнения конкретных этапов работ указаны в Календарном плане.

2.3. Сроки начала и окончания выполнения Работ по Договору, включая сроки начала и окончания выполнения этапов Работ, являются исходными для определения штрафных санкций в случаях их нарушения.

2.4. Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих исполнению своих обязательств в сроки, предусмотренные Договором, по независящим от них причинам, в том числе, по причине действия (бездействия) государственных органов, их должностных лиц и/или иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами к исполнению обязательств по Договору, будут оказывать друг другу необходимое содействие для устранения таких обстоятельств и причин и/или их последствий, а при необходимости, рассмотрят возможность изменения сроков выполнения работ (части работ) и отдельных обязательств по Договору.

### 3. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ

3.1. Интересы Заказчика по Договору представляет уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности.

3.2. Интересы Подрядчика по Договору представляет уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности/Устава.

3.3. Все взаимоотношения при исполнении Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде.

3.4. Подрядчик и его уполномоченные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с исполнением Договора.

### 4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Договора составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.<sup>1</sup>

4.2. Стоимость (цена) этапа Работ устанавливается в Календарном плане, с учетом НДС.

4.3. Цена Договора не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в п. 4.6 Договора. Настоящим Подрядчик подтверждает, что все расходы, включая непредвиденные расходы, налоги, сборы и финансовые обременения, возникающие в связи с надлежащим и полным исполнением им своих обязательств по Договору, были учтены в момент заключения Договора, и что общая стоимость Работ по Договору включает в себя все затраты Подрядчика, покрытие его рисков, налоги и сборы, издержки, связанные с санкционными, инфляционными и валютными рисками и любые иные расходы, и затраты по исполнению Договора.

Цена Договора является твердой и не подлежит индексации, в том числе в случае изменения установленных Договором сроков выполнения Работ или невыполнения Исполнителем Работ в надлежащие сроки.

Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора (статья 451 Гражданского кодекса РФ), не является основанием для увеличения цены Договора.

4.4. Финансирование Заказчиком выполненных по Договору Работ осуществляется в следующем порядке:

4.4.1. Стоимость (цена) Работ в рамках этапа (-ов) Работ оплачивается Подрядчику в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ по этапу (-ам), представленный в соответствии с Календарным планом (опись передаваемой документации, разработанной в рамках этапа (-ов) работ должна являться неотъемлемой частью акта сдачи-приёмки выполненных работ по этапу (-ам)), а также счет на оплату работ, выполненных в рамках соответствующего этапа (-ов), выставленный Подрядчиком). Исполнитель обязан своевременно выставить Заказчику счет на оплату выполненных Работ после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как сумма выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ (определяется в соответствии с актом сдачи-приёмки работ по этапу (-ам)).

4.5. Оплата выполненных Работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 13 Договора, в пределах цены Договора.

4.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Договором объем Работ при изменении потребности в таких работах или, при выявлении потребности в дополнительном

---

<sup>1</sup> Если Подрядчик не является плательщиком НДС на основании норм налогового законодательства, то указанный пункт следует изложить в следующей редакции: «Цена Договора составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек. НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_ (указывается ссылка на норму налогового законодательства)»

Здесь и далее по договору упоминание НДС убрать.

объеме работ, не предусмотренных Договором, но связанных с Работами, предусмотренными Договором.

При выполнении дополнительного объема работ, предусмотренного настоящим пунктом, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить цену Договора пропорционально объему дополнительных работ, но не более чем на десять процентов цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в выполнении Работ, предусмотренных Договором, Стороны обязаны соответственно уменьшить цену Договора.

Все изменения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Заказчик может правомерно задержать Подрядчику оплату выполненных Работ в следующих случаях:

4.7.1. предъявление Подрядчиком Заказчику результатов Работ по Договору, в том числе и по отдельным этапам, с нарушением сроков, предусмотренных Календарным планом;

4.7.2. задержка оформления актов сдачи-приёмки Работ, счетов-фактур (если применимо) либо выставляемых счетов по вине Подрядчика;

4.8. Стороны пришли к соглашению, что отсрочка суммы оплаты за работы в рамках Договора не является коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского кодекса Российской Федерации, и не дает Подрядчику права и не является основанием для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. по согласованию с Подрядчиком, в соответствии с законодательством Российской Федерации и п. 9.4 Договора вносить необходимые дополнения и изменения в Техническое задание;

5.1.2. давать Подрядчику письменные распоряжения (указания, предписания, разъяснения) относительно выполнения Подрядчиком обязательств по Договору, с указанием срока исполнения таких распоряжений, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Во избежание сомнений в течение срока действия Договора к таким распоряжениям могут относиться указания, запросы Заказчика в отношении уточнения (корректировки, дополнения, актуализации) любых материалов, разработанных Подрядчиком и, в том числе, принятых Заказчиком в рамках исполнения того или иного этапа;

5.1.3. владеть, пользоваться и распоряжаться переданными ему по Договору результатами Работ, этапов Работ (включая результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в отчетных материалах) по своему усмотрению (без получения дополнительных согласований и/или разрешений Подрядчика);

5.1.4. требовать от Подрядчика выполнения Работ и сдачи результатов Работ (этапов Работ), отвечающих установленным в Договоре требованиям, в сроки, предусмотренные Календарным планом;

5.1.5. требовать от Подрядчика безвозмездного устранения в сроки, установленные Заказчиком, недостатков, а также возмещения причиненных Заказчику убытков и (или) соразмерного уменьшения цены Договора в случаях, когда результаты Работ выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий Договора, в том числе Технического задания, требований законодательства Российской Федерации;

5.1.6. отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке (расторгнуть Договор в одностороннем порядке на основании ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) в соответствии с п. 9.2 Договора и потребовать возмещения убытков, в случае если дефекты (недостатки) результатов Работ по Договору (результатов работ по отдельным этапам) в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, а также в иных случаях, установленных Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

## 5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. принять указанные в п. 1.1 Договора результаты Работ у Подрядчика либо предоставить мотивированный отказ в порядке, установленном разделом 6 Договора;

5.2.2. в пятнадцатидневный срок с момента получения письменного обращения Подрядчика, направленного в соответствии с подп. 5.3.1 Договора, давать указания и разъяснения;

5.2.3. регистрировать и хранить обращения Подрядчика на протяжении срока действия Договора.

## 5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. обращаться к Заказчику за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с исполнением Договора. Обращения Подрядчика представляются в письменной форме по адресу, указанному в разделе 13 Договора;

5.3.2. требовать оплаты Заказчиком результатов выполненных и принятых Работ в соответствии с условиями Договора;

5.3.3. передавать Заказчику результат выполненных Работ, соответствующий установленным Договором требованиям, в соответствии с Календарным планом как по каждому этапу Работ отдельно, так и по нескольким этапам выполнения Работ вместе (в случае письменного согласия Заказчика).

## 5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. регистрировать и хранить на протяжении срока действия Договора распоряжения (указания, предписания, разъяснения) Заказчика;

5.4.2. выполнить предусмотренные Договором Работы в объеме, сроки и в строгом соответствии с условиями, установленными Договором, а также надлежащего качества, в том числе с учетом подп. 5.1.2 Договора;

5.4.3. заблаговременно в письменной форме уведомлять Заказчика о возможности наступления событий, препятствующих выполнению Работ. Если в процессе выполнения Работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения Работ, Подрядчик обязан приостановить их и, в трехдневный срок с момента такого приостановления, письменно поставить об этом в известность Заказчика;

5.4.4. по требованию Заказчика представить в письменной форме необходимую информацию, касающуюся исполнения обязательств по Договору, в течение 2 рабочих дней с момента получения указанного требования;

5.4.5. осуществлять и оплачивать сбор исходных данных, получение технических условий, необходимых согласований.

5.4.6. Уведомлять Заказчика о лицах, под контролем которых находится Подрядчик, а также о выгодоприобретателях по заключенному Договору, в отношении которых применяются специальные экономические меры, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», в течении 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора, и в течении 2 (двух) рабочих дней с даты изменений в составе лиц под контролем которых находится Подрядчик и (или) выгодоприобретателей в период исполнения Договора.

## **6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ**

6.1. Сдача-приемка результатов выполненных Работ по отдельным этапам осуществляется в следующем порядке:

6.1.1. В течение 1 (одного) календарного дня с момента завершения каждого этапа Работ Подрядчик направляет Заказчику:

- соответствующий результат выполнения Работ по (под)этапу и/или документальное подтверждение достижения результатов этапа в составе, определенном Техническим заданием;
- отчет о выполненных мероприятиях в рамках (под)этапа Работ;
- два экземпляра акта сдачи-приемки выполненных Работ по данному (под)этапу, подписанные со стороны Подрядчика.

6.1.2. Заказчик рассматривает материалы и документы, указанные в подп. 6.1.1 Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения от Подрядчика.

В случае отсутствия замечаний Заказчик подписывает акт сдачи-приёмки выполненных Работ по соответствующему этапу Работ в установленный в настоящем пункте срок и направляет его Подрядчику.

При наличии замечаний к представленным по результатам выполнения Работ по этапу материалам и документам Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в приёмке выполненных Работ. Такой отказ должен содержать требования о доработке результатов Работ/отчетных материалов с указанием сроков такой доработки.

Требования Заказчика, изложенные в мотивированном отказе, являются обязательными для Подрядчика. Установленный Заказчиком срок устранения нарушений не влечет за собой перенос сроков выполнения Работ по Договору (в том числе не влечет перенос сроков выполнения этапов Работ). В случае направления Заказчиком мотивированного отказа Подрядчик не вправе требовать увеличения сроков выполнения Работ по Договору, и Заказчик не лишается права требовать от Подрядчика уплаты неустоек, предусмотренных Договором.

6.1.3. После устранения Подрядчиком недостатков в соответствии с требованиями Заказчика, изложенными в мотивированном отказе, повторная сдача-приемка Работ осуществляется в порядке, указанном в подпунктах 6.1.1, 6.1.2 Договора.

6.2. Если недостатки результатов Работ или любой их частей выявлены Заказчиком после подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных Работ, Подрядчик обязан по требованию Заказчика и за свой счет устранить выявленные недостатки в установленные Заказчиком сроки.

6.3. Работы по этапу в соответствии с Календарным планом считаются выполненными, если получен и принят Заказчиком результат выполненных Работ по этапу Работ, соответствующий условиям Договора.

6.4. Отчетные материалы, а также разработанные в рамках исполнения по Договору документы и материалы, должны предоставляться Заказчику на бумажном носителе и в электронной форме на электронном носителе информации на русском языке. Стороны подтверждают, что в рамках выполнения Работ результаты Работ (в том числе промежуточные результаты) могут выражаться в форме письменных консультаций, предоставляемых Заказчику в виде документов в электронной форме на электронном носителе информации и/или в бумажной форме, в форме устных консультаций, в форме организационных мероприятий. Стороны в ходе исполнения Договора могут договориться об иных формах предоставления результатов выполнения Работ, подписав соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору. В случае расхождений между содержанием результатов Работ результаты Работ на бумажном носителе будут иметь преимущественную силу по отношению к результатам, предоставленным в иных формах. При этом для целей настоящего пункта под результатом Работ (включая промежуточные результаты) понимаются любые документы и материалы, направленные Подрядчиком Заказчику в рамках выполнения Работ по Договору.

6.5. Подрядчик имеет право, если это возможно, исходя из состава, объема и содержания Работ по этапу, по согласованию с Заказчиком досрочно выполнить и сдать Заказчику Работы по любому этапу, а Заказчик при условии отсутствия у него возражений в отношении досрочного выполнения Работ и замечаний к таким Работам принять их в порядке, установленном Договором. Во избежание сомнений, досрочная приемка не влияет на порядок определения срока платежа Заказчика по такому этапу.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

7.2. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за качество и объем выполненных в рамках Договора Работ, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств в сроки, предусмотренные Договором. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

7.3. За допущенные Подрядчиком нарушения условий Договора Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в следующих случаях:

7.3.1. За нарушение сроков выполнения Работ по этапам в соответствии с Календарным планом – в размере 0,2% (ноль целых две десятых) процента от стоимости соответствующего этапа Работ, установленной в Календарном плане, за каждый день просрочки вплоть до момента фактического исполнения просроченного обязательства.

7.3.2. За нарушение Подрядчиком срока начала или окончания выполнения Работ по Договору – 0,2% (ноль целых две десятых) процента от цены Договора за каждый день просрочки.

7.3.3. В случае, если Подрядчик не устранил недостатки в выполненных Работы в соответствии с требованиями и установленными сроками Заказчика, изложенными в мотивированном отказе – в размере 7 (семи) процентов от цены соответствующего этапа, указанной в Календарном плане, и 12 (двенадцати) процентов от цены соответствующего этапа, указанной в Календарном плане - при повторном нарушении.

7.3.4. В случае сокрытия Подрядчиком сведений, предусмотренных п. 11.14 Договора, непредоставления таких сведений либо предоставления сведений, не соответствующих действительности - в размере 3 % (трех) процентов от цены Договора, указанной в п. 4.1. Договора, за каждый случай.

7.3.5. В случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного согласования с Заказчиком - штраф в размере 50 (пятидесяти) процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику.

7.4. Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки по каждому факту выявления вышеназванных нарушений.

7.5. В случае непредставления или несвоевременного представления Подрядчиком информации, указанной в подпункте 5.4.6 Договора, Заказчик имеет право потребовать уплаты Подрядчиком штрафа, в размере 10 % от общей цены Договора, за каждый случай нарушения.

7.6. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в разделе 13 Договора, либо указанный в направленном Заказчиком требовании в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования, если иной срок не указан в требовании Заказчика.

7.7. При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных подпунктами 7.3.1 – 7.3.5 Договора, Заказчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, установленном этими подпунктами, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Договору. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств, периоды просрочки.

7.8. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

7.9. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

## **8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на исполнение Договора.

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга в письменной форме не позднее 7 (семи) календарных дней с момента их наступления.

8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по Договору откладывается на период действия обстоятельств непреодолимой силы или иной согласованный Сторонами срок.

8.3. Если действие обстоятельств непреодолимой силы длится свыше 30 (тридцати) календарных дней, Стороны принимают решение о пересмотре сроков исполнения Договора, либо о его расторжении. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.4. Факт наступления и действие обстоятельств непреодолимой силы, а также их продолжительность, должны быть подтверждены документально компетентным органом.

8.5. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в связи с наступлением обстоятельства непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

## **9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.

9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в следующих случаях:

9.2.1. отказа от устранения или неустранения допущенных Подрядчиком недостатков (дефектов) в результатах выполнения Работ, указанных Заказчиком в мотивированном отказе, либо допущения несогласованных с Заказчиком отступлений от Технического задания, технических условий или нормативно-правовых актов, либо фактического неисполнения предписаний Заказчика, изложенных в мотивированном отказе, в течение срока, определенного Заказчиком;

9.2.2. аннулирования или отсутствия у Подрядчика необходимых разрешений на выполнение видов работ, предусмотренных Договором, и (или) прекращение членства Подрядчика в соответствующих саморегулируемых организациях;

9.2.3. вынесения актов, налагаемых государственными органами в рамках законодательства, лишаящих права Подрядчика на выполнение работ;

9.2.4. непредоставления документов в соответствии с п. 11.14 Договора, непредоставления таких сведений либо предоставления сведений, не соответствующих действительности;

9.2.5. задержки (нарушения срока) Подрядчиком окончания выполнения Работ, предусмотренных Договором, более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

9.2.6. неоднократного (2 раза и более) нарушения более чем на 10 (десять) календарных дней сроков выполнения Работ за этапы Работ, установленных Договором;

9.2.7. подачи Подрядчиком в суд заявления о признании его несостоятельным (банкротом), а равно вынесение в отношении Подрядчика определения суда о введении наблюдения или иной процедуры банкротства;

9.2.8. принятия учредителями (участниками) или соответствующим органом решения о ликвидации Подрядчика;

9.2.9. принятия регистрирующим органом решения об исключении Подрядчика из ЕГРЮЛ;

9.2.10. приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

9.2.11. приостановления операций по счетам Подрядчика;

9.2.12. если Подрядчик осуществил одновременную передачу прав и обязанностей по Договору (передачу Договора) другому лицу;

9.2.13. если Подрядчик уступил свои права (требования) к Заказчику без получения необходимого согласия в соответствии с п. 11.9 Договора;

9.2.14. если в отношении Подрядчика, а также лиц(а), под контролем которого(ых) находится Подрядчик и (или) выгодоприобретателя(ей) по заключенному Договору, применяются специальные экономические меры, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций»;

9.2.15. а также в иных случаях в соответствии с действующим законодательством.

9.3. При наличии указанных в п. 9.2 Договора обстоятельств Заказчик направляет Подрядчику уведомление в письменном виде о расторжении Договора в одностороннем порядке.

В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке и по основаниям, предусмотренным Договором, он считается расторгнутым с момента, указанного

Заказчиком в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора, либо, если уведомление Заказчика было получено Подрядчиком за пределами срока, указанного в уведомлении, – с момента доставки уведомления Подрядчику (п. 11.12 Договора). Приемка работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение расходов и (или) убытков, связанных с выполнением таких работ, Заказчиком не производится.

9.4. Внесение изменений в Договор осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью Договора с момента подписания его Сторонами.

9.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору (расторжения Договора в одностороннем внесудебном порядке на основании ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) в порядке и по основаниям, предусмотренным Договором, Заказчик не возмещает Подрядчику какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с таким отказом.

9.6. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору Подрядчик обязан:

- немедленно прекратить выполнение Работ;
- не позднее, чем в день прекращения Договора, передать Заказчику по акту все документы, связанные с выполнением Работ;
- не позднее, чем в день прекращения Договора, передать Заказчику все документы, образовавшиеся в процессе выполнения Работ, и акт сдачи-приемки на Работы, выполненные до получения уведомления об отказе от исполнения Договора. В этом случае порядок приёмки Работ аналогичен порядку, установленному в разделе 6 Договора.

## **10. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ**

10.1. При исполнении Договора по вопросам, неурегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.2. Споры, связанные с исполнением, расторжением, прекращением, действительностью Договора и иные споры, связанные с Договором, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении Договора, обязателен для Сторон. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения, если иной срок не указан в претензии, который не может быть менее 15 (пятнадцать) рабочих дней. К претензии обязательно прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения, расчёт денежных требований и документы, удостоверяющие полномочия подписавшего претензию представителя Стороны (за исключением случая подписания претензии лицом, имеющим право действовать без доверенности). Без указанных документов претензия считается ненаправленной.

Направление Заказчиком Подрядчику требования об уплате штрафных санкций, предусмотренных Договором, требования об устранении недостатков выполненных работ или иного требования одновременно является направлением досудебной претензии (требования) по смыслу абз. 1 п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Если в течение срока, указанного в Договоре или в требовании Заказчика, Подрядчиком не уплачена указанная в таком требовании денежная сумма/не устранены недостатки в выполненных работах/не осуществлены иные действия, указанные в требовании, то в случае возникновения гражданско-правового спора, связанного с указанным требованием Заказчика, порядок досудебного урегулирования такого спора считается соблюденным.

## **11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

11.1. Заказчик и Подрядчик обязуются взаимно обеспечивать конфиденциальность всей передаваемой или известной друг другу информации относительно Договора и выполняемых (выполненных) работ.

11.2. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц прав на результаты Работ и прав воспрепятствовать их применению или ограничивать их применение. В случае  
ID 24050272



возникновения таких прав у третьих лиц Подрядчик несет всю полноту ответственности перед заинтересованными лицами.

11.3. Право собственности на результаты Работ, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в результате выполнения Работ (а также в результате доработки и исправления результатов работ) переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами промежуточного акта сдачи-приёмки выполненных Работ по соответствующему этапу выполнения Работ.

11.4. В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.

11.5. Договор заключен в электронном виде. Стороны вправе продублировать подписание Договора на бумажном носителе. Подписание Договора на бумажном носителе не является оформлением факта заключения Договора и не ведет за собой установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

11.6. Договор вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения возникших у них из Договора обязательств надлежащим образом.

11.7. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

11.8. Одновременная передача Подрядчиком всех прав и обязанностей по Договору другому лицу (передача Договора) не допускается.

11.9. Подрядчик вправе уступить отдельные права (требования) к Заказчику другому лицу только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой сделки (уступки требования) со стороны Заказчика.

11.10. Подрядчик в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику.

11.11. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить друг друга в письменной форме об изменении реквизитов Сторон, указанных в Договоре. В случае изменения лиц, представляющих интересы по управлению Договором, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения о замене представителя с приложением документа (или его надлежаще заверенной копии), подтверждающего полномочия представителя. В указанных случаях заключение соглашения о внесении изменений в Договор не требуется.

11.12. Любое сообщение (уведомление, требование, запрос), адресованное одной Стороной другой Стороне в связи с исполнением, расторжением или прекращением Договора, должно совершаться в письменной форме.

Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом:

– в момент вручения адресату, если оно доставлено курьером, в том числе его уполномоченному представителю;

– в момент доставки или (в зависимости от того, что наступит раньше) по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно направлено адресату заказным либо ценным почтовым отправлением;

– на следующий рабочий день, если оно направлено телеграфом.

11.13. Стороны подтверждают, что им известны и понятны требования Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных федеральных законов и нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, связанные с проведением Заказчиком закупок (далее – Законодательство о закупках), включая порядок заключения и исполнения договоров, требования Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе статей 4, 8, 10, 11, 11.1, 12, 13 и главы 2.1 и 3 указанного закона, положения статей 14.32 и 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, иных федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Федеральной антимонопольной службы, образующих систему нормативно-правовых актов,

регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции (далее – Антимонопольное законодательство).

Стороны гарантируют, что при подписании и исполнении Договора Стороны, их работники учитывают требования действующего Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках, неукоснительно ими руководствуются и осознают серьезность последствий, к которым может привести их несоблюдение.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники не осуществляют и намерены впредь воздерживаться от запрещенных Антимонопольным законодательством и/или Законодательством о закупках действий (бездействия), влекущих ограничение, устранение, недопущение конкуренции на каком-либо рынке товаров, работ или услуг, в том числе при исполнении своих обязательств по Договору: не заключать и/или не исполнять соглашения, устные договоренности с хозяйствующими субъектами или органами и организациями, исполняющими государственные функции, в случае, если они способны привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, не осуществлять в отношении конкурентов незаконных или недобросовестных действий, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, и способны причинить другим хозяйствующим субъектам убытки или вред, а в случае, если Стороны занимают на каком-либо рынке товаров, работ услуг положение, дающее ему возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем рынке, он также намерен воздерживаться от извлечения от такого положения несправедливой выгоды.

11.14. Подрядчик гарантирует, что Договор не является для него крупной сделкой, а также сделкой, на совершение которой в соответствии с законодательством и учредительными документами Подрядчика требуется согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для Подрядчика Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте Договора, Подрядчик до его подписания обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие такое согласие (одобрение).

## 12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

12.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. В случае противоречия между текстом Договора и текстом, содержащимся в приложениях к Договору, преимущественную силу имеет текст Договора.

12.1.1. Приложение № 1 – Техническое задание.

12.1.2. Приложение № 2 – Календарный план.

## 13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### Заказчик

#### Общество с ограниченной

ответственностью «Автодор-Инжиниринг»

Адрес юридического лица:

127006, г. Москва, Страстной бульвар,

дом 9, эт. 3 пом. XV, ком. 7

ИНН 7710946388 / КПП 770701001

ОГРН 1137746777871

Расчетный счет 40702810438090012143

Московский банк ПАО Сбербанк

Кор. счет 30101810400000000225

БИК 044525225

эл. адрес: [post@avtodor-eng.ru](mailto:post@avtodor-eng.ru)

### Подрядчик

Адрес юридического лица: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

*(если отличается от адреса ЮЛ)*

ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_

Р/с \_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_

К/с \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

эл. адрес: \_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на выполнение работ по созданию ведомственной опорной геодезической сети по**  
**автомобильной дороге М-12 «Восток» участок Москва – Казань (0 – 8 этап)**


*(заполняется в порядке, установленном для заключения Договора в Разделе VIII. «Заключение Договора по результатам проведения конкурентной закупки» Документации)*

**Перечень нормативно-технических документов**

- ГОСТ 32453-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек. - Москва, Стандартинформ, 2014.
- ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ. Утверждена приказом Роскартографии от 29.06.1999 г. № 86-пр.
- ГКИНП (ГНТА)-01-006-03 Основные положения о государственной геодезической сети Российской Федерации, М., 2004.
- ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съёмочного обоснования и съёмке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, - М., 2002.
- Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей, - Москва, «Картгеоцентр», «Геодезистдат», 1993г.
- Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах, ПТБ-88, М., Недра, 1991.
- ГОСТ 59865-2022 «Дороги автомобильные общего пользования, Сети геодезические для проектирования и строительства. Общие требования».
- СП 46.13330.2012 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 (с Изменениями N 1-5).
- СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве.
- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства.
- СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
- СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ.




## Конструкция пункта ВОГС №2

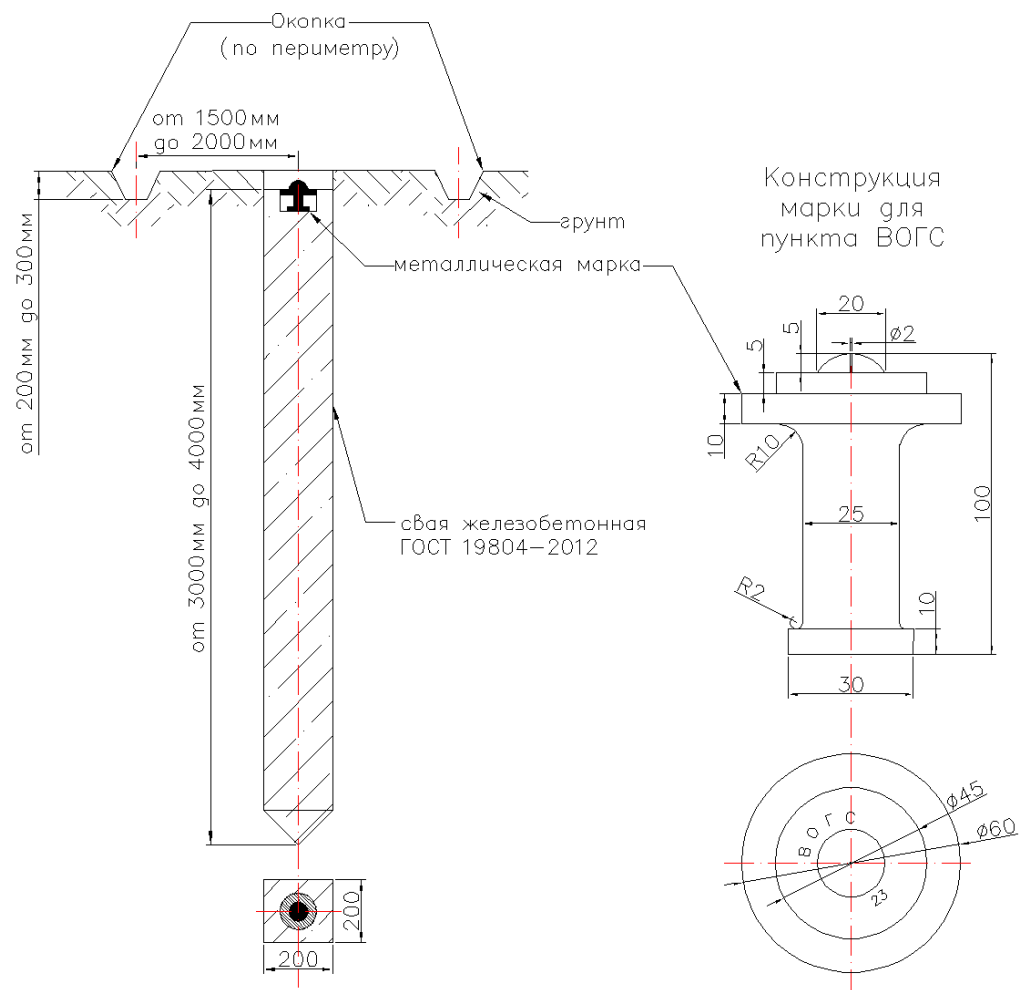

Все размеры указаны в миллиметрах

### Конструкция внешнего оформления пункта ВОГС

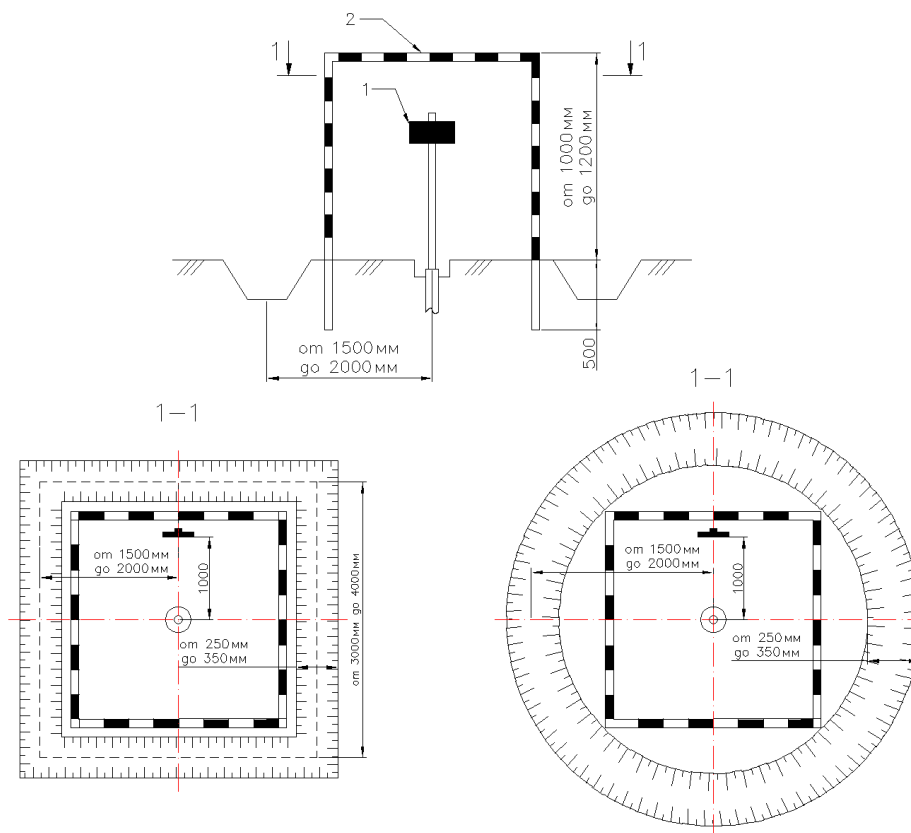

Все размеры указаны в миллиметрах

1 - Металлическая табличка (указание информации в следующей последовательности: наименование заказчика, год закладки, наименование пункта)

2 - Металлическое внешнее ограждение, окрашенное в яркий цвет, выделяющийся на общем фоне (уголок или профильная труба 20x20/ 30x30 мм)

**Календарный план  
на выполнение работ по созданию ведомственной опорной геодезической сети по  
автомобильной дороге М-12 «Восток» участок Москва – Казань (0 – 8 этап)**

№ этапа Работ	Состав работ	Наименование работ в соответствии с Техническим заданием	Начало работ	Окончание работ	Цена этапа, в %
	<b>Полевые работы</b>				
1	Создание ведомственной опорной геодезической сети (ВОГС) вдоль автомобильных дорог	1.1.	С даты подписания договора	В течение 20 календарных дней с даты начала работ	60
	<b>Камеральные работы</b>				
2	Обработка результатов наблюдений на пунктах ВОГС, ГГС и ГНС (ФАГС)	2.1.	С даты окончания работ п. 1.1.	В течение 10 календарных дней с даты начала работ	40
ИТОГО:					100
